

“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México”

OFICIO: 210C2601A000000-313/2023
San Felipe del Progreso, México,
10 de abril de 2023.

DR. EDUARDO GERARDO ROSAS GONZÁLEZ
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
P R E S E N T E

Sirva por este medio para enviarle cordiales saludos, al tiempo que derivado de la asignación del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) para el ejercicio 2023, me permito remitir a Usted el Primer Informe de Avance Trimestral (correspondiente a enero-marzo), descriptivo y fotográfico y el cierre de ejercicios anteriores FAM 2022.


Sin otro particular por el momento, quedo a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE


UNIVERSIDAD
INTERCULTURAL
ESTADO DE MÉXICO

RECTORIA
DRA. XÓCHITL GUADARRAMA ROMERO
RECTORA

"Ma ra mpɛfigo ka ra mbenze najo'o mpero bonzkeji yothe ka ra mbenze najo'o"
"El que trabaja le va bien, pero el que trabaja con y para la gente le va mejor"

C.c.p.  DRA. CARMEN E. RODRÍGUEZ ARMENTA, DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL.
L.C.P. RODRIGO PRECIADO JERÓNIMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA UIEM.
L.C. LORENA ESQUIVEL FIGUEROA, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA UIEM.
MINERVA CRUZ GONZÁLEZ, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA UIEM.
ARCHIVO
XGM/MCG/dtg.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE MÉXICO

2023



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre reportado
PRIMER TRIMESTRE
 FECHA DE DATE: ENTREGARZO

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad Intercultural del Estado de México**
 Entidad federativa: Estado de México
 Clave Inst 011: 15MSU0932A



Nombre: **Minerva Cruz González**
 Cargo: Jefa del Departamento de Planeación
 Teléfono: 01 (712) 123 5963 Ext. 107
 Correo electrónico: planeacion@uim.edu.mx

RESPONSABLES

Nombre: **L.C.P. Rodrigo Preciado Jerónimo**
 Cargo: Director de Administración y Finanzas
 Teléfono: 01 (712) 1235963 Ext. 108
 Correo electrónico: eyr@uim.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas			
		Clase de institución	Ensayos, pruebas	Aspiraciones y mejoras	Mantenimiento				Proyectos sustentables	Espacio/equipo	cantidad				Metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Construcción de la Segunda Etapa del Edificio Xochipilli, plantel Tepetitlaxpa	X				\$ 16,648,885.00	\$ -	\$ 16,648,885.00						0	01/05/23	31/12/23	Se está realizando la rectificación del proyecto en la plataforma.							
TOTAL									0	0.00														
						\$16,648,885.00	\$0.00	\$16,648,885.00																

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE MÉXICO
 DRA. XÓCHITL GUADARRAMA ROMERO
 RECTORA

L.C.P. RODRIGO PRECIADO JERÓNIMO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

¹ Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se pueden anexar tanta filas como sea necesario.
² En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
³ Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2023

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL, DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre reportado
PRIMER TRIMESTRE
FECHA DE CORTE: ENERO-ABRIL

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance
0

PRONUMER 1 Nombre de la obra: **Construcción de la Universidad Intercultural del Estado de México Plantel Tepetitlaxpa, edificio Xochipilli**


CRONIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO



FOTOS

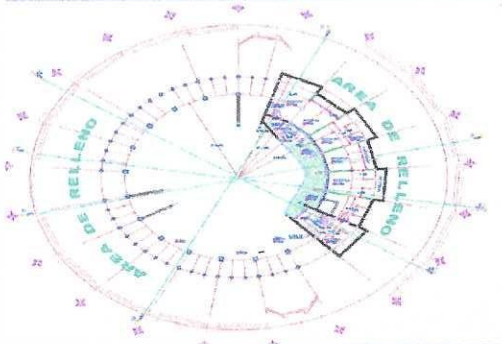


F1: Fachada principal




F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:
Se está realizando la rectificación del proyecto en la plataforma.

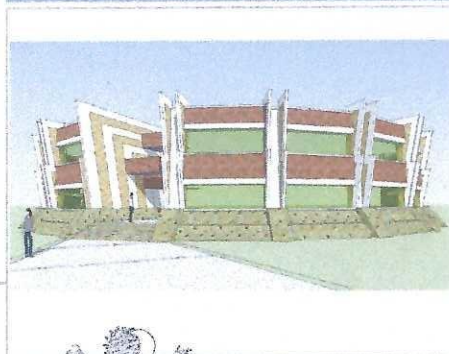

F3: Fachada posterior

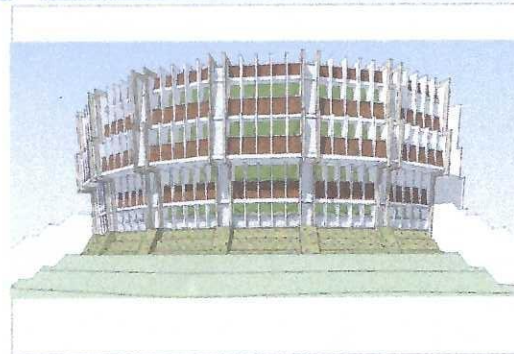

F4: Entrada



F5: Interior de aula

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL
ESTADO DE MEXICO
DRA. XOCHITL GUZBARRAMA ROMERO
RECTORA

L.C.P. RODRIGO PRECIADO JERÓNIMO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.
